

## Záznam ze 4. kontrolního dne na stavbě D1 0137 – Přerov - Lipník n. Bečvou,

konaného dne 18.2.2016 v 9:00 hod v zasedací místnosti Technické dozorčí správy Přerov (Troubky 900). Přítomní dle prezenční listiny.

**3/2 město Přerov** (p. Košutek) – dotaz na přesun autobus. zastávky Lýsky  
Skanska činí kroky vedoucí k přemístění zastávky (nejlépe do intravilánu obce Lýsky), jednání na magistrátu města Přerova, podá žádost na Krajský úřad - ODSH o stanovení úpravy provozu. Dokud nebude zastávka přesunuta, nebude skrz železniční podjezd projíždět staveništní doprava s ornici. Plánovaná skrývka 1. úseku od 23.11. (postup proti staničení, km 90,4 → Přerov) nezačne pokud nebude provedeno přemístění zastávky na vhodnější místo. Skanska žádá o součinnost dotčených orgánů.

*18/2 Průchod pod žel. podjezdem byl zabezpečen betonovými svodidly a dopravním značením. Jedná se o provizorní řešení do doby, než bude zastávka definitivně přemístěna do intravilánu obce (zajišťuje město Přerov). Během používání provizorní přeložky bude zhotovitelem stavby upraven i prostor autobus. zastávky, tak aby byl umožněn bezpečný pohyb chodců v blízkosti stavby. Vybudování nové zastávky v intravilánu MČ Lýsky město Přerov oznámí zhotoviteli stavby.*

**3/3 OÚ Buk** (p. Vrtělka) – kdy bude probíhat manipulace s popílky?  
Manipulace s popílky ze skládky Prosenice bude probíhat nejdříve na jaře 2016.  
*18/2 Zatím není znám přesný termín.*

**3/4 OÚ Prosenice** (p. Dokoupil) – kdy bude navážena ornice na L5?  
Návoz ornice na L5 se předpokládá v prosinci.  
*18/2 Navážení ornice na L5 probíhá, uskutečnila se schůzka zhotovitele se starostou, koordinováno s Moravskou Zemědělskou.*

**3/5 Povodí Moravy** (Ing. Čížek) – nedoporučuje využití L1 a L5, jsou v záplavové oblasti, nechat provést hydrotechnické posouzení aktuálního stavu.  
ŘSD předá podklady pro povážení ornice na L1 a L5 k hydrotechnickému posouzení na Povodí Moravy (Brno, ul. Dřevařská, Ing. Jelínková) spolu s žádostí o stanovisko. Podle získaného vyjádření bude rozvoz ornice případně upraven.  
*18/2 stanovisko PM vydáno, jeho doporučení budou při rozvozu ornice respektována, zhotovitel přizve zástupce PM na místo povážení.*

**3/11 SSOK** (pí. Kolářová) – zatím neobdržela trasy pro návoz materiál na stavbu, pouze pro rozvoz ornice. POV pro navážení ornice zhotovitel teprve zpracovává, bude hotové až v prosinci 2015.  
*18/2 předán POV na CD.*

### 3/12 Plán kontrolních dnů na rok 2016:

Vždy třetí čtvrtek v měsíci v 9:00 hod na TDS v Přerově (Troubky 900). Bude rozeslána pozvánka na e-mail (případná změna termínu ze závažných důvodů vyhrazena):  
18.2., 17.3., 21.4., 19.5., 16.6., 21.7., 18.8., 15.9., 20.10. 24.11., 15.12.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.04.00.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/2

#### 4/1 Zhotovitel (Skanska)

- bylo promítnuto šikmé video (letecký pohled na trasu stavby dálnice)
- probíhají skrývky ornice v celé trase, likvidace zahradních domků v Předmostí, je vykácena většina porostů v TZ, jsou budovány staveništní komunikace, probíhá příprava přeložek plynovodů, práce na rekonstrukci chmelnic
- průběžně je zpracovávána RDS jednotlivých objektů

**4/2 město Přerov** (Ing. Zlámal + pí. Šikulová) – SO 120 Úprava místní komunikace Vinary – Popovice, žádají doplnit monitoring užívaných komunikací o cca 26m ke křižovatce s MK Kočiče a provést diagnostiku mostu přes Vinarský potok na místní komunikaci Kočiče (viz příloha); upozorňují na nesoulad stávající konstrukce vozovky s návrhem skladby v SO 120 úprava MK Vinary - Popovice

**4/3 vlastníci komunikací** (město Přerov, SSOK, obce) – upozorňují na nutnost uzavřít „Dohody o užívání komunikací“ mezi ŘSD a vlastníkem komunikace. Nutno stanovit rozsah užívaných komunikací v souladu s POV, následně budou uzavírány dohody s jednotlivými vlastníky.

**4/4 obec Veselíčko** (p. Motyka, p. Šulák) – dotaz zda cesty pro odvoz ornice budou stejné jako pro navážení materiálu; upozorňuje, že cesta Osek – Veselíčko je v havarijním stavu, poškozené krajnice; žádá provést čištění příkopů zanesených po čištění komunikace od nečistot ze stavby. Zhotovitel bude užívat jen schválené komunikace, na kterých bude udržovat technický stav umožňující běžný provoz a průběžně zajišťovat řádné čištění.

**4/5 MČ Vinary** (Ing. Grapl) – Vinary jsou místní část města Přerov připojená dvojicí komunikací, které zde končí: Vinary – Lýsky a Vinary – Popovice. Tyto cesty jsou využívány k dopravě obyvatel do města (také cyklisté a pěší). V zájmu jejich bezproblémového a bezpečného pohybu žádáme o udržování čistoty komunikací, ale hlavně o splnění příslibu stavbyvedoucího (p. Sotolář), že vždy jedna komunikace zůstane nezatížena stavbou. Žádáme o vhodnou koordinaci prací (odvoz ornice x uzavírky uvedených komunikací) a předání informací.

**4/6 město Přerov** (p. Košutek) – upozornil na stížnost týkající se hluku a zápachu od mechanizace (možná zhotovitele dálnice) parkující v areálu stavebnin na Prostějovské ulici, nabízí se možnost výhodnějšího parkování stavebních strojů v areálu SSOK na ul. Hranická. Zhotovitel se domluví s vedoucím střediska SSOK.

**4/7 město Lipník n. B.** (Ing. Příkryl) – vyzval přítomné, aby se na KD řešili závažné problémy, které nelze vyřešit na místě se zhotovitelem

**4/8 Zhotovitel** (Skanska) - místo navrhovaných webových stránek o stavbě budeme jako dodavatel s okolím stavby komunikovat formou nástěnek a to v tom smyslu, že vždy na KD předáme a poté i elektronicky rozešleme na dotčené obce a příp. další orgány zprávu co se momentálně na stavbě děje, jak se to může dotknout občanů, na koho se mohou obracet atd. Obce si zprávu mohou vyvěsit na obecních vývěškách, vložit do místního zpravodaje apod.

V PŘEROVĚ DNE 18.2.2016


PODPIS



ZAPSAL: JANOVSÝ

Příloha: 2x situace k bodu 4/2, prezenční listina

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/2

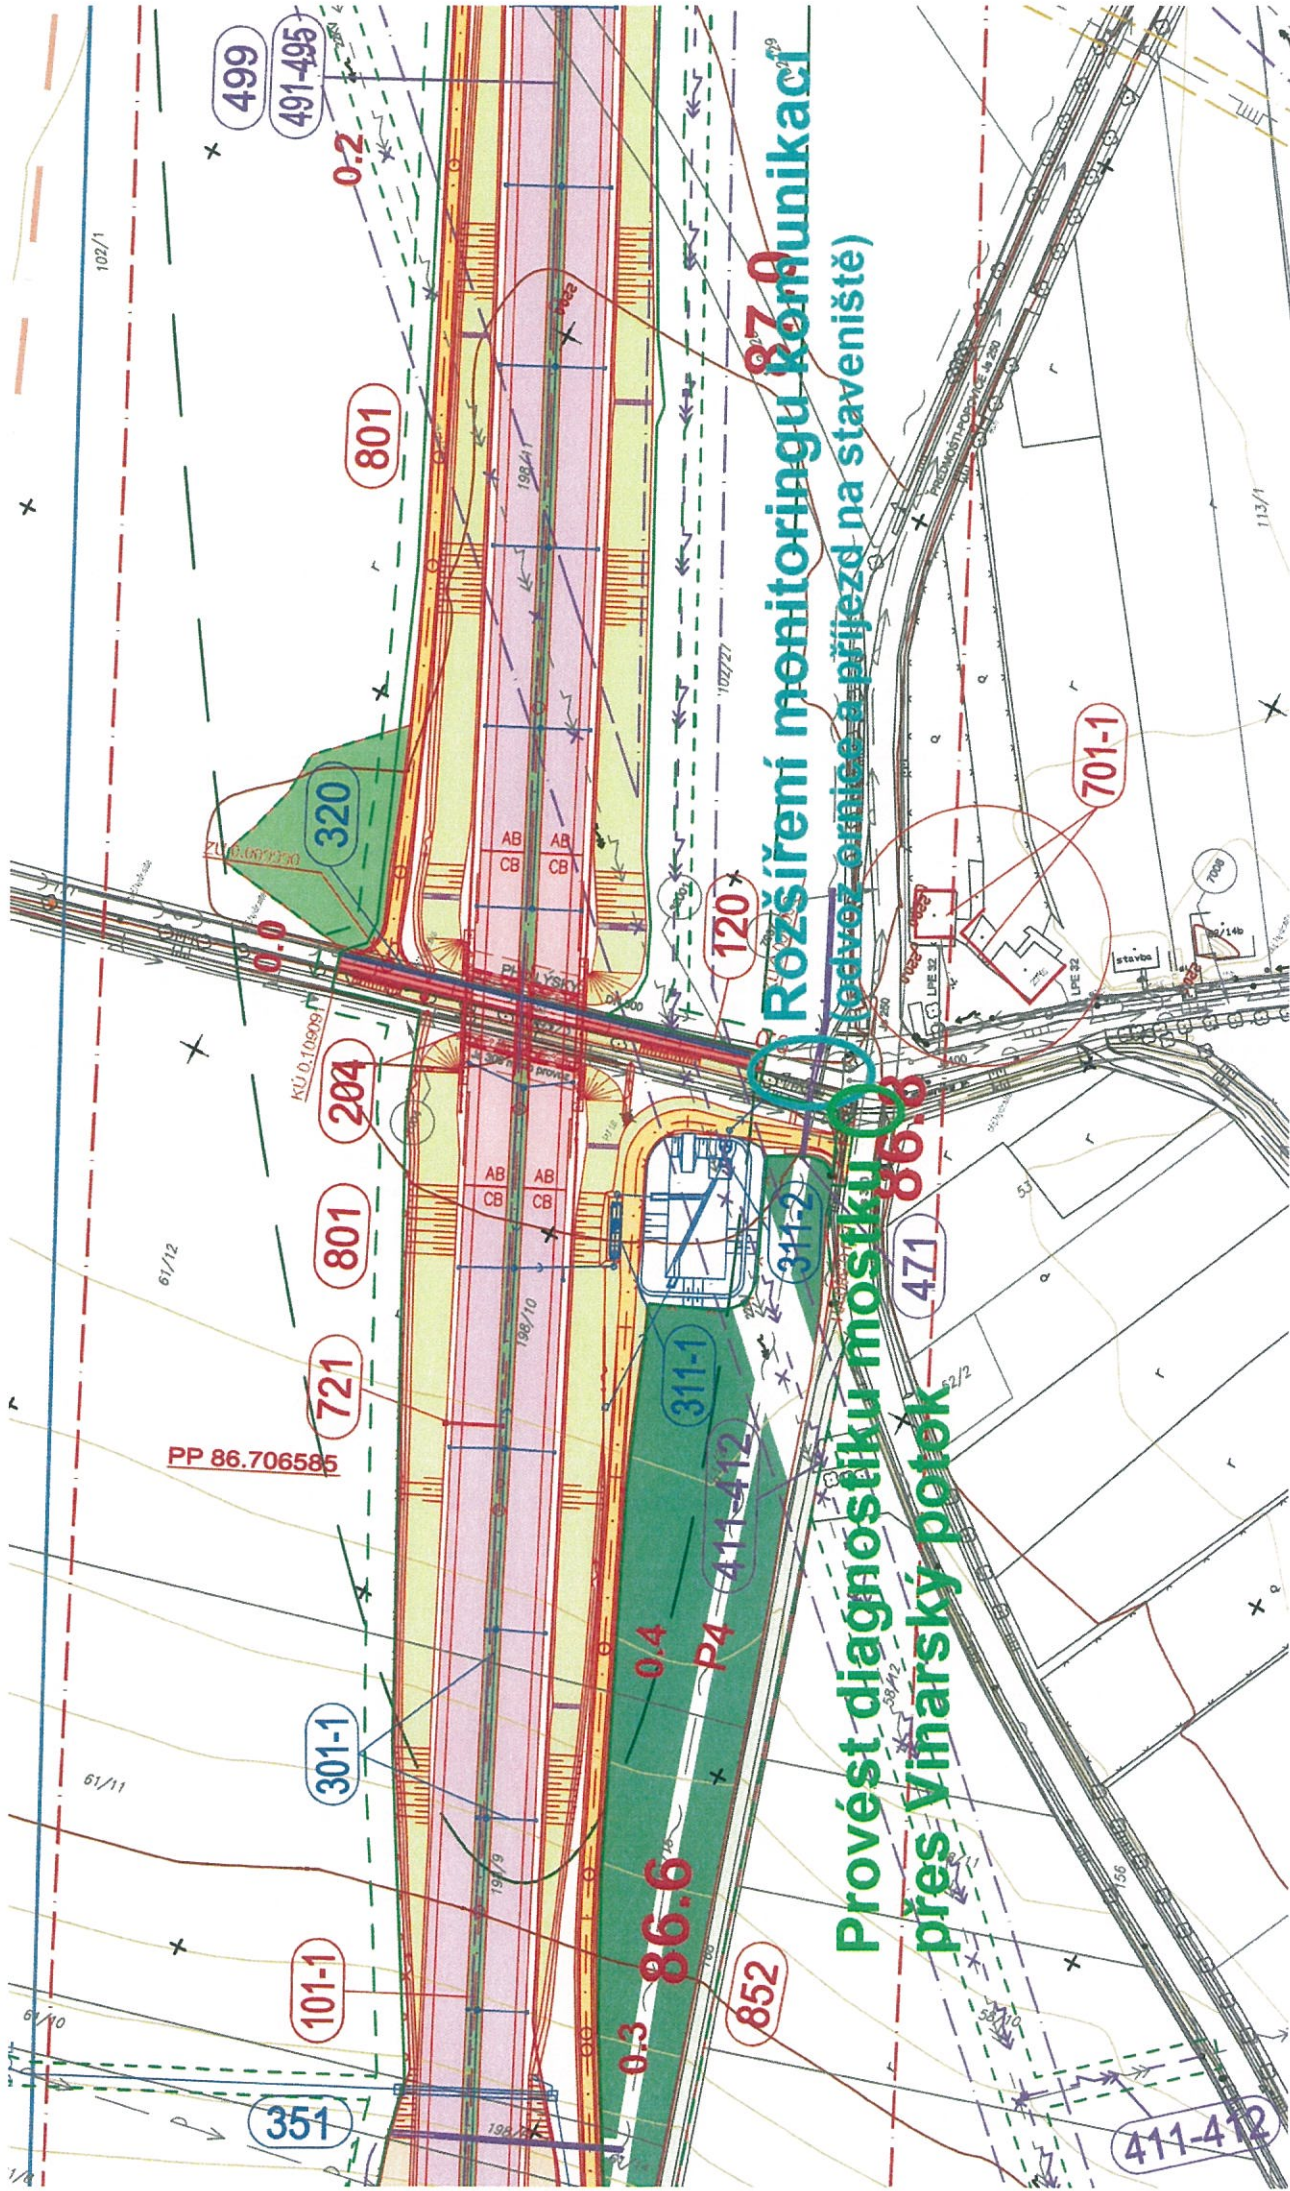


**Rozšíření monitoringu komunikací**

**(odvož ornice a příjezd na staveniště)**

**Provést diagnostiku mostku 86.6  
přes Viharský potok**

471

411-412



SO 204 Most na D1 přes MK a Vinnarský potok (km 85,820)

SO 120 Úprava místní komunikace Vinnary - Popovice

SO 151 VPUK přístup k SO 311-1 a SO 311-2 a pozemkům po šlinci III/438

Rozšíření monitoringu komunikace (obvoz. úmíst. a přístup na stavbu)

Provedení diagnostiky mostu přes Vinnarský potok

Místní komunikace Kocdíře

Stávající přístup ke stavbě (do vybudování VPUK SO 151) - polní cesta

Měření a poznámky

- Měření
- Poznámka
- Kresba
- Edlovat, zrušit, obnovit
- Uložit
- Naladit
- Smazat

