


Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás informovali o průběhu stavebních prací během výstavby dálnice

D1, stavba 137 Přerov – Lipník v období prosinec 2017.

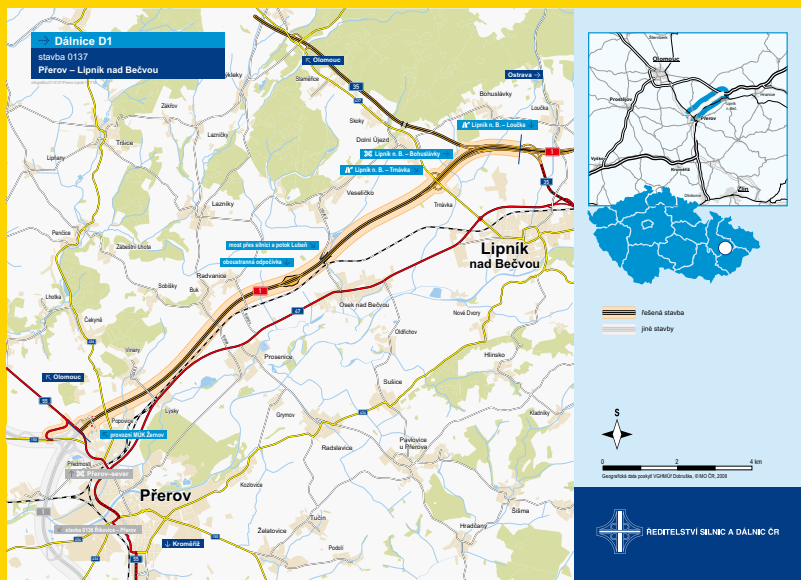

Převážná část zemních prací na stavbě je soustředěna především v prostoru mostních objektů. Hlavním důvodem je úprava přístupů a ploch u mostních objektů, aby bylo možné pokračovat v pracích na mostních objektech i za zhoršených klimatických podmínek. Ukončili jsme zemní práce spojené s odkopy a ukládáním popílků do násypu. V lokalitě Předmostí bylo odkopáno cca 17 tisíc m³ popílků a zabudováno v násypu před dálničním mostem u silnice Prosenice – Buk. V lokalitě Prosenice jsme odkopali necelých 40 tisíc m³ popílků a uložili v násypech za dálničním mostem u silnice Prosenice – Buk, u mostního objektu pod Radvanicemi a v násypu za dálniční estakádou u silnice Osek – Veselíčko. Obě úložiště popílků i vlastní násypy byly na dobu zimního období přesypány tenkou vrstvou zeminy, která slouží jako ochrana proti povětrnostním podmínkám.

V lokalitě jezírka Prosenice v trase dálnice před úložištěm popílků byly osazeny horizontální inklinometry ve dvou monitorovacích profilech (určeno pro sledování sedání zemního tělesa nad zasypaným jezírkiem) a zahájili jsme sypaní vlastního násypu zemního tělesa v tomto prostoru.

Pokračují práce na mostních objektech. V místě uzavřené silnice I/55 Přerov – Olomouc pracujeme na spodní stavbě, na místní komunikaci Přerov – Žernava jsme dokončili konsolidační násyp (konsolidace potrvá minimálně do konce února 2018), u silnice II/436 Čekyně – Přerov byl zabetonován mostní oblouk. Vedle provizorní komunikace Lýsky – Vinary začaly práce na spodní stavbě mostu, na mostním objektu u silnice III/4368 Buk – Prosenice jsme dokončili spodní stavbu mostu a zahájili jsme práce na stavbě skruže. U silnice Veselíčko – Osek se připravuje výstavba nosné konstrukce, stejně jako vedle účelové komunikace Osek – Dolní Újezd. V prostoru MÚK (mimoúrovňové křižovatky) Lipník bylo zabetonováno poslední pole mostu vpravo od D35.

V prostoru MÚK Lipník byla od 27. listopadu 2017 puštěna do provozu severní kolektorová větev ve směru Ostrava – Olomouc.

Během zimního období 2018 jsou v plánu takové práce na mostních objektech, kde bude i přes nepříznivé klimatické podmínky zajištěna jejich vysoká kvalita. Jedná se o mostní objekt v místě přerušené silnice I/55, dále u silnice Přerov – Čekyně, Lýsky – Vinary, Prosenice – Buk a Osek – Veselíčko. Zemní práce budeme provádět v rozsahu nezbytně nutném. Naplno se práce rozeběhnou až v jarním období.

Spoluobčané, ubezpečujeme vás, že děláme vše, abychom minimalizovali dopad našich činností na vás, obyvatele z blízkého okolí stavby, a neomezovali jsme váš běžný život.

Děkujeme za pochopení
Skanska

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: d1lipnik@skanska.cz
